


岸壁の耐震強化工事期間中は、施工箇所の岸壁の使用や係留をできなくなります。
耐震強化工事についてのご理解・ご協力の程よろしくお願い致します。

工事内容について

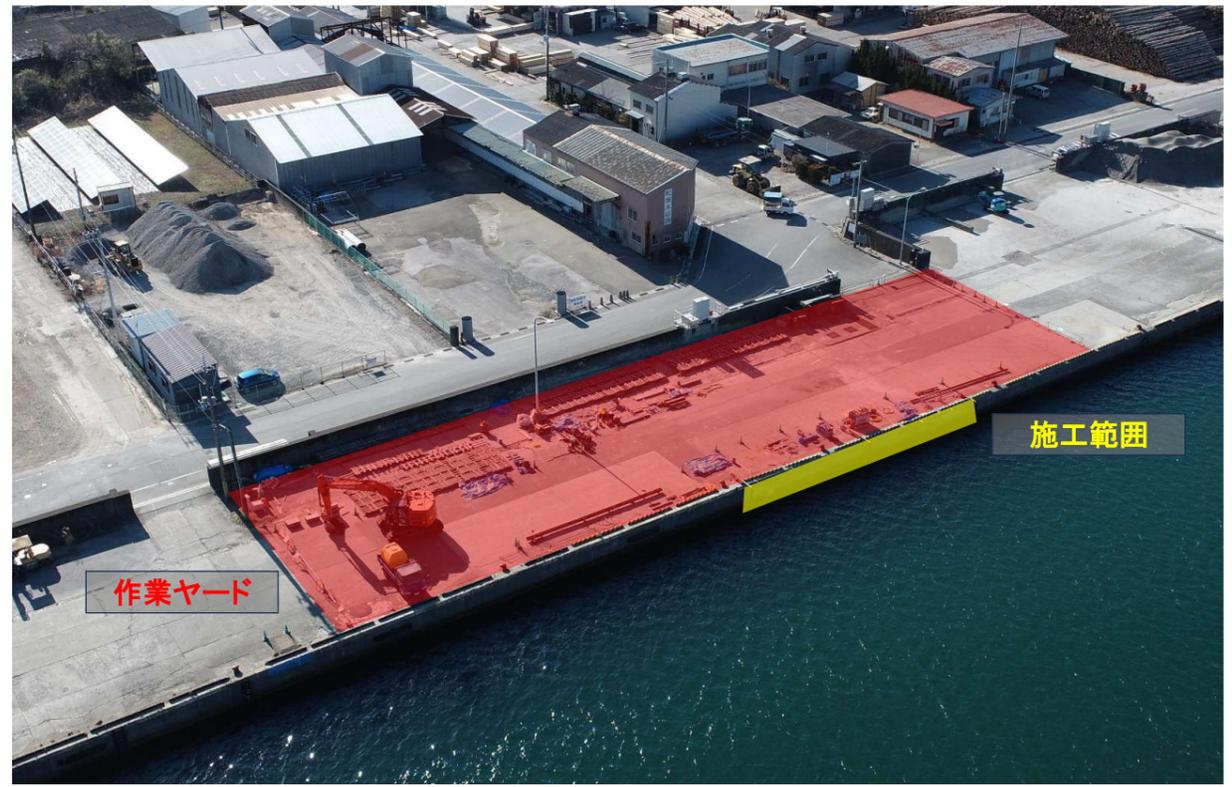

現場付近を上空から（2月末時点）

須崎港改修工事 工事ニュース

株式会社 勝賀瀬土建 現場代理人 田中 秀幸（携帯090-6286-5602）


作業内容

○ 3 月

○2月
鉄筋の設置を終え、コンクリート打設を始めました。コンクリートは11回に分割して打設する予定です。
今月はそのうちの6回を施工しました。



コンクリート打設はポンプ車のホースを打設箇所まで移動させて行います。潜水作業となるので、事前にしっかりと打合せをしてから作業に取り掛かります。

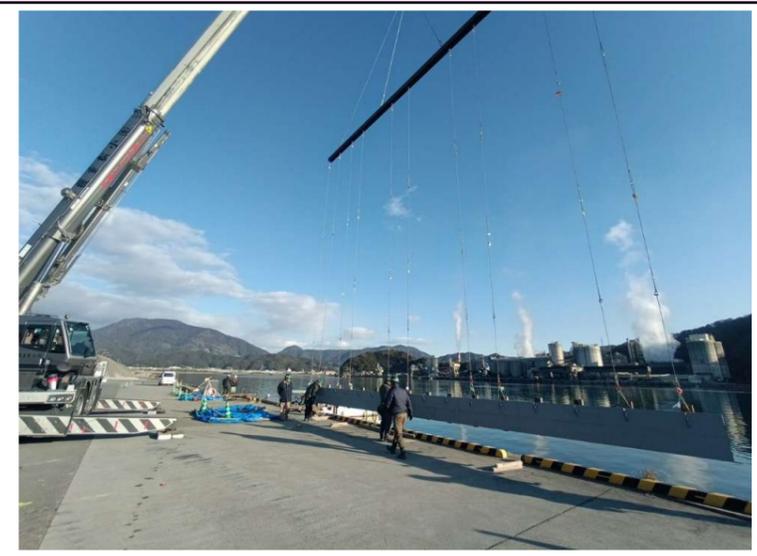


← 型枠吊り込み状況

コンクリートと同様に、11分割した型枠を1分割ずつ組立・設置しています。1分割の大きさは、高さ約0.9m×延長約12.5mです。水平・垂直になるよう注意して設置します。

○3月
残りのコンクリートの打設を行います。全体の打設完了後、強度が確保できたことを確認し、型枠を外していきます。脱型が終われば、本工事も完成になります。残りの期間も工事へのご理解・ご協力よろしくお願ひします。

↑コンクリート打設状況
またコンクリートの落下防止として、筒先にカバーをして、ホースの移動を行います。

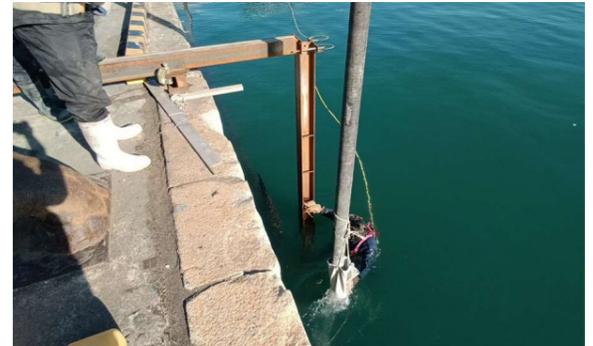

2025年 2月
【第8号】
（発注者）
高知県須崎
土木事務所
（港湾漁港管理課）
【工事ニュース作成者】
（受注者）
株式会社
勝賀瀬土建
