

工事内容について


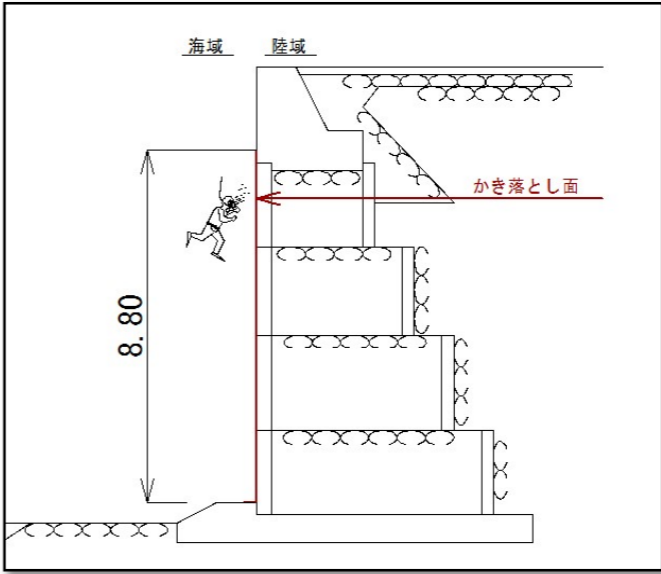

岸壁の耐震強化工事期間中は、施工箇所の岸壁の使用や係留をできなくなります。
耐震強化工事についてのご理解・ご協力の程よろしくお願い致します。
浚渫施工時には、汚濁防止フェンスを設置していますので、気をつけて航行をお願いします。
安全第一で工事を進めていきます。



現場付近を上空から（10月末時点）

須崎港改修工事 工事ニュース

株式会社 勝賀瀬土建 現場代理人 田中 秀幸（携帯090-6286-5602）

作業内容	○ 10 月	○ 11 月
<p>○10月 潜水士による浚渫や既存岸壁の調査を行いました。今後の施工について、調査結果を基に発注者と協議を進めています。 また浚渫土及び揚収物の搬出・処分も進めています。</p>	<p>浚渫土内にワイヤーや金属くず、タイヤなどが混入していました。これらは分類し、処分をしています。</p>  <p>← 揚収物</p>	<p>→ 下地処理イメージ</p> 
<p>○11月 浚渫が完了しだい、汚濁防止フェンスを撤去する予定です。また、浚渫土の搬出が完了後、岸壁上の大型土のうも撤去していきます。 海中では、岸壁面の下地処理を行っていきます。 岸壁利用者の皆様にはご迷惑をお掛けしております。工事へのご理解・ご協力をお願い致します。</p>	<p>→ 潜水士による壁面形状調査</p>  <p>岸壁を構成しているブロックが写真の様にずれしており、隙間になっている箇所も確認されました。これらへの対応について、現在発注者と協議を行っております。</p>	<p>岸壁面に付着している貝殻を除去します。除去した貝殻は収集し、陸上にて処分します。 その後、ブロックの隙間への対応を行う予定です(発注者と協議中)。</p>

2024年 10月【第4号】

(発注者)
高知県須崎土木事務所
(港湾漁港管理課)

【工事ニュース作成者】

(受注者)
株式会社 勝賀瀬土建
