



工事内容について



岸壁の耐震強化工事期間中は、施工箇所の岸壁の使用や係留をできなくなります。
 耐震強化工事についてのご理解・ご協力の程よろしくお願ひします。
 浚渫施工時には、汚濁防止フェンスを設置していますので、気をつけて航行をお願いします。
 安全第一で工事を進めていきます。




須崎港改修工事 工事ニュース

株式会社 勝賀瀬土建 現場代理人 田中 秀幸 (携帯090-6286-5602)

作業内容

○9月

○9月
 発注者と検討・協議が整ってきましたので、工事に着手していきたく思います。
 浚渫範囲内の磁気探査を9日頃から行います。磁気探査の結果、問題なければ浚渫作業に順次移行していきます。
作業ヤード赤枠内にバックホウを設置し、岸壁足元の堆積土を浚渫していきます。
 浚渫した堆積土は**オレンジ枠内**に一時仮置きを行い、適正に処分する予定です。
 その後エアリフトにより岸壁に接触している土砂を取り除きます。

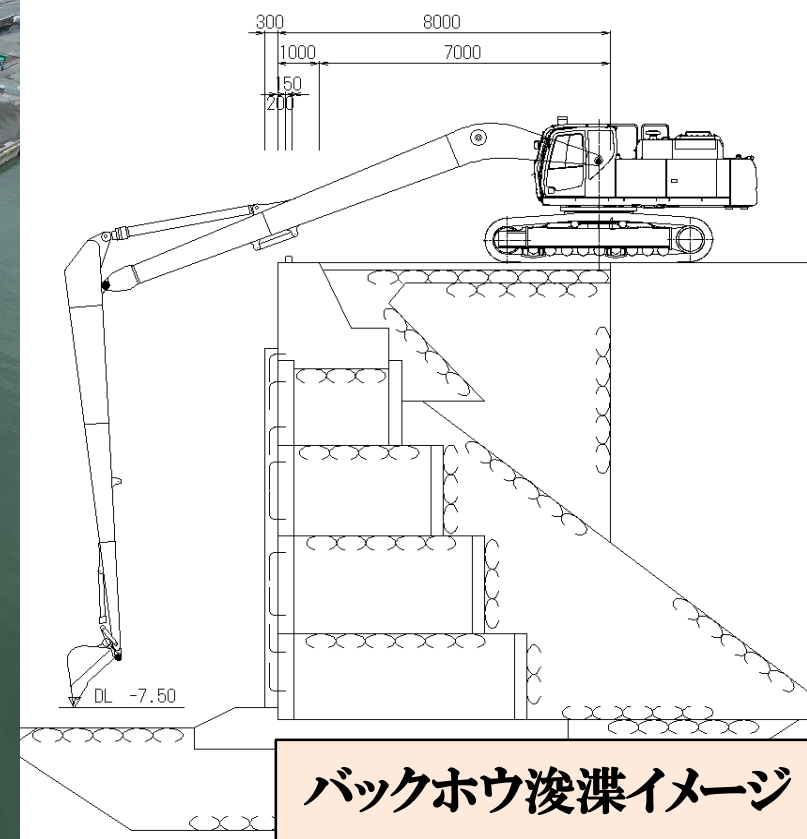

2024年 8月
【第2号】

(発注者)
高知県須崎
土木事務所
(港湾漁港管理課)

【工事ニュース作成者】

(受注者)
株式会社
勝賀瀬土建
